

Nächste Aufgaben

Zeitplanung


- [Doodle](#) für Mai
- [Doodle](#) für Juni
- [Doodle](#) für Juli ...
- [Doodle](#) für August
- [Doodle](#) für September

Messen

- ~~Mit nem Rotationslaser o.ä. den höchsten Punkt auf dem Boden rausfinden~~ - Done 2.2.2013
Hintere Rechte Ecke passt schon
- ~~Echten Meterstrich bestimmen und festlegen~~ - Done 2.2.2013 Meterstrich auf 1.11m über dem Boden 10cm für den Boden und 1cm Toleranz
- ~~Frontfläche aller Heizungsbuchten in eine Liste schreiben~~ - Material vorhanden
- ~~Lars hat in Sketchup einen Plan des Gesamten Raums angefangen, letzte Details fehlen(Stand 2.2.2013)~~ - wird vermutlich nicht mehr benötigt

Planen

- ~~Einen Weg entwickeln, den Strom von der Tür zu Schornstein zu kriegen~~ - macht Martin(Kampelektriker)
- ~~Genauen Elektroplan (wo welche Dose) erstellen, Netzwerk etc. nicht vergessen haben~~ Crnf und MacGoever gemacht
- ~~Elektroeinkaufsliste erstellen, mit Martin besprechen~~ - Material bestellt und größtenteils geliefert
- ~~Spacige Schiebetür designen, technische Umsetzung andenken~~ ([Schiebetür](#)) - wurde wegen möglicher Unzuverlässigkeit verworfen
- ~~hüfthohe Abgrenzung für die Rampe aus Treppenhaus in Vortragsraum planen. Bodenhöhe beachten! Maximale Steigung: 6%~~
- ~~So sollten die Heizungsbuchten zugemacht werden(Schimmel, etc), Materialbedarf kalkulieren.~~ - Material ist da, übrige Buchten müssen noch wegen Feuchtigkeit begutachtet werden.

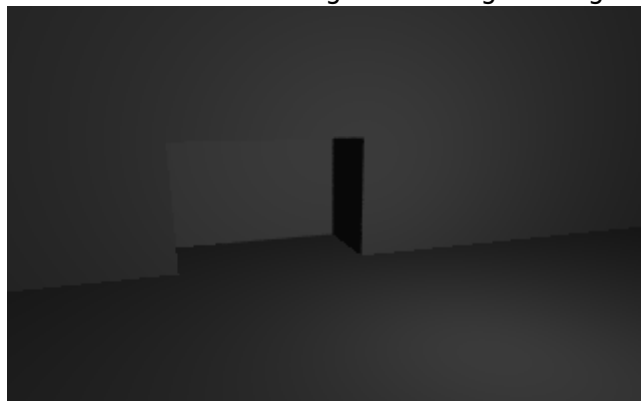

- rot: Dämmung

- gelb: Dichtschaum
- grün: Folie
- blau: Dachlatten
- Grau: Trockenbauplatte
- ~~Die Ausmaße der Mateecke ausrechnen~~ - Mateecke wegen Unflexibilität verworfen
- ~~2-faches Lackieren / Schleifen des Bodens planen und Materialbedarf berechnen~~

Bauen

- ~~nördliche Wand mit Elektro ausrüsten~~
- ~~nördliche Wand fertig bauen~~
- ~~südliche Wand mit Elektro ausrüsten~~
- ~~gelbe Säcke über die neuen Stühle ziehen~~ - done am 1.2.14
- ~~südliche Wand fertig bauen~~ - untere Kante in der zukünftigen Zone zumachen, gegen Mäuse - done 15.2.14
- ~~westliche Wand mit Elektro ausrüsten~~ - done(1.2.14)
- ~~Schiene in den Unterzügen freikratzen~~
- ~~Trockenbauschiene für optionale Wand montieren~~ - entfällt
- ~~westliche Wand fertig bauen~~
- ~~Unterkonstruktion Projektionsfläche vervollständigen~~ done 9.2.14
- ~~Projektionsfläche mit Elektro ausrüsten, ggf. müssen Löcher in die Steinwand~~
- ~~Projektionsfläche mit Gipskarton beplanken~~ - done 9.2.14
- ~~Projektionsfläche Fugen gipsen~~
- ~~Projektionsfläche Schleifen?~~
- ~~Einbau Revisionsklappe in Projektionsfläche wegen Telefonleitungen~~
- ~~Elektrobühnen unter die Decke montieren~~ - Done 15.2.14
- ~~Rahmen für hüfthohe Abgrenzung für die Rampe von der Treppenhaustür in den Raum bauen~~ - done
- ~~Elektro in die Abgrenzung montieren~~
- ~~Abgrenzung beplanken OSB(1.2cm) und Gipskarton dadrauf~~
- ~~Wand im Projektraum zu den Warpzone Räumen auf 1m Abstand leer Räumen~~
- ~~Elektro für Flur/Vortragsraum/kleinen Raum an 2.Kasten in Wand zw. kleinem/großem Raum~~
- ~~Schacht zum Dachaufbau isolieren~~
- ~~Unterverteilung am Kamin anbauen~~
- ~~Elektrokasten von Wand auf OSB-Platten montieren~~
- ~~Elektroleitungen durch die Bühne ziehen~~
- ~~Netzwerkkabel in Bühne ziehen~~
- ~~restlichen Heizungsbuchten zumachen~~
- ~~Löcher im Kamin wo der Lüfter stand zumauern~~
- ~~Balkon Alten Teer entfernen, reinigen~~ 29.3.14
- ~~Balkon mit Isolierung/abdichtung bestreichen~~
- ~~Balkon: Teerpape verlegen~~
- ~~Balkon: Bauschutzmatte verlegen~~
- ~~Klinkerwände spachteln~~
- ~~Wände grundieren~~
- ~~Wände streichen~~ - done
- ~~Ecke 1.Teilstück Grundieren~~



- Grundierte Ecke streichen 1.Schicht – Erwähnte Ecke:
- Grundierte Ecke streichen 2.Schicht
- Projektionsfläche mit Tiefengrund vorbereiten. Nochmal vorbereiten.
- Projektionsfläche streichen weiss matte Farbe
- Grundierte Wände an den Fenstern innen (also direkt um den Fensterrahmen) 1.Schicht Streichen
- Grundierte Wände an den Fenstern innen (also direkt um den Fensterrahmen) 2.Schicht Streichen



- Kabelkanäle an der Wand Richtung Haus A anbringen
- im großen Raum Balken parallel zur kürzeren Wand ausrichten, Abstand: 42cm oder 2 Zollstockglieder – done
- Betongefüllte Gefrierbeutel zur Unterfütterung der Balken einbringen – done
- 22mm OSB Platten auflegen und verleimen – done
- Boden im großen Raum schleifen, Warpzonelogo in schwarz auflackieren?, lackieren, schleifen, lackieren – done
- Material aus dem kleinen Raum und dem Vortragsraum in den großen schaffen
- Kleine Wand im Vortragsraum Schleifen
- Ecke Grundieren + 2mal Streichen
- Innteil der „Schächte“ in den Wänden (umgedrehtes Kreuz) 2. Schicht streichen
- Kabelkanäle an der Wand Richtung Favela anbringen (erst nach Abschluss der Streicharbeiten)



- 90% done

- Kabelkanäle an der Wand Richtung Albersloher Weg anbringen
- Wand im kleinen Raum überprüfen ob geschliffen werden muss
- Bauschutt/Müll – sortieren & Entsorgen (Müllkippe Coerde) <
- Wand Fensterrichtung Verputzen (–> Jörg Fragen) - done
- im Vortragsraum Balken parallel zur kürzeren Wand ausrichten, Abstand: 42cm oder 2 Zollstockglieder
- Betongefüllte Gefrierbeutel zur Unterfütterung der Balken einbringen
- 22mm OSB Platten auflegen und verleimen
- Boden in Vortragsraum mit Bodenschleifer schleifen, lackieren, schleifen, lackieren

- Türen einbauen
- Heizkörper montieren lassen
- Wand zum Treppenhaus mit Tiefengrund vorbehandeln. Nochmal vorbehandeln.
- Wand zum Treppenhaus weiß streichen.
- Wand im Vortragsraum mit Elektrokasten zumachen - done
- Elektrodosen auflegen - XX% done (fast fertig)
- Netzwerkdosen auflegen - ~50% done im großen Raum
- Elektrozuleitung legen lassen
- Leerrohr zwischen kleinem und großem Raum montieren und Löcher in die Wände sägen
- flexibles Leerrohr zwischen großem Raum und Dach montieren
- restlichen Kamin in OSB einpacken
- 2x150mm Löcher Richtung Dach für Dunstabzug

Entsorgen

- Metallschrott abholen lassen - Done 2.2.2013 selbst weggebracht
- Restlichen Müll / Kunst entsorgen - 30.01.2014 aller Müll sollte weg sein

Informieren

- Newspost mit spektakulären Fotos und Timelapse von der Aktion am Samstag posten (alles auf dem NAS) done by commander

Besprechung Hawerkamp

Protokoll Gespräch mit Hans und Udo

From:

<http://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:

http://wiki.warpzone.ms/projekte:neueraeume:next_tasks?rev=1426012763

Last update: **01.03.2017**

